

新庁舎整備だより

令和4年7月


鳥栖市市庁舎新築工事の進捗状況や予定についてお知らせします。

●工事全景写真

(令和4年5月末時点)



(令和4年6月末時点)

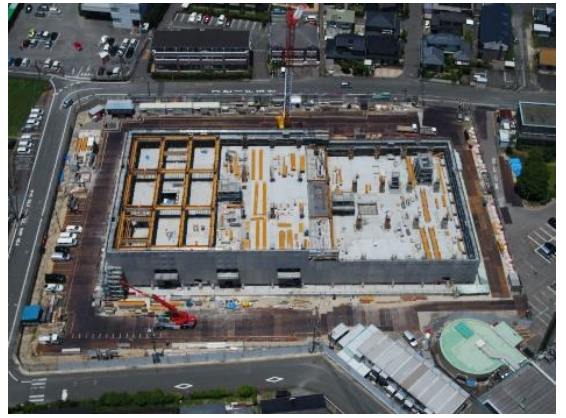

●工事の進捗状況



屋上の大庇を施工するための、足場を組んでいます



屋上の床を施工しています。

●工事スケジュール（7月～8月）

項目	7月中旬	7月下旬	8月上旬	8月中旬	8月下旬
躯体工事	→				
内装工事					→
外構工事			→		

※躯体工事の際にコンクリートミキサー車・大型トレーラー車などの工事用大型車両の通行が多くなります。
※コンクリート打設後に、コンクリートの均し作業を行うため、深夜まで作業を行うことがあります。

※裏面もご覧ください

●鳥栖工業高校 新庁舎工事現場見学会を行いました

6月9日（木）に鳥栖工業高校建築科の生徒さんを対象に新庁舎の工事現場見学会を行いました。

見学会では、工事概要の説明や、免震ピット、配筋の状況、内装工事前の躯体工事の状況などを見学していただきました。



工事概要の説明



設計コンセプトの説明



免震ピット内の見学



躯体状況の見学



配筋状況の見学



朝礼現場の見学

【問い合わせ先】

〔建築工事〕 前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 87-8632

〔電気設備工事〕 佐電工・シグマ・電興社特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎(0942)50-5806

〔機械設備工事〕 栄城・有明・古賀設備共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 85-8804

鳥栖市役所 庁舎建設課 ☎ (0942) 85-8755
