

新庁舎整備だより

令和4年9月


鳥栖市市庁舎新築工事の進捗状況や予定についてお知らせします。

●工事全景写真


(7月末時点)



(8月末時点)



●工事の進捗状況

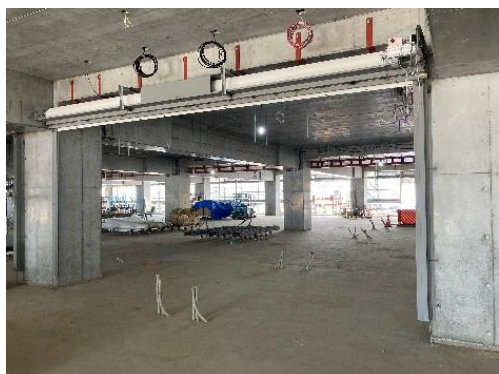

1階の内装工事を行っています。



屋上の鉄骨工事を行っています。

●工事スケジュール (9月~10月)

項目	9月中旬	9月下旬	10月上旬	10月中旬	10月下旬
躯体工事	→				
内装工事	→				
外構工事	→				

※躯体工事の際にコンクリートミキサー車・大型トレーラー車などの工事用大型車両の通行が多くなります。

※コンクリート打設後に、コンクリートの均し作業を行うため、深夜まで作業を行うことがあります。

※裏面もご覧ください

■インターンシップに来ていただきました

佐賀大学理工学部の学生に8/16～8/19の4日間、インターンシップに来ていただきました。

インターンシップでは、新庁舎の図面確認、現場見学のほか、図面の作図補助をしていただきました。

鉄筋コンクリート造の現場見学は初めてとのことで、熱心に現場を見ていただきました。

現場見学の様子



建物全景の見学



免震装置の見学



内装工事の見学



躯体工事の見学



仮囲いの見学



施工方法について、
熱心に質問していました

【問い合わせ先】

〔建築工事〕 前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 87-8632

〔電気設備工事〕 佐電工・シグマ・電興社特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 50-5806

〔機械設備工事〕 栄城・有明・古賀設備共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 85-8804

鳥栖市役所 庁舎建設課 ☎ (0942) 85-8755
