

新庁舎整備だより

令和4年10月

鳥栖市市庁舎新築工事の進捗状況や予定についてお知らせします。

●工事全景写真

(8月末時点)




(9月末時点)



●工事の進捗状況



屋上の梁を施工しています。

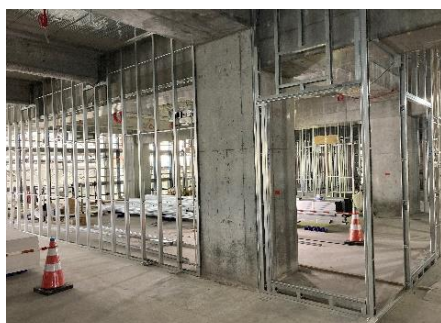

2階の内装工事を行っています。

●工事スケジュール（10月～11月）

項目	10月中旬	10月下旬	11月上旬	11月中旬	11月下旬
躯体工事	→				
内装工事	→				
北別館工事	→				

※躯体工事の際にコンクリートミキサー車・大型トレーラー車などの工事用大型車両の通行が多くなります。

※コンクリート打設後に、コンクリートの均し作業を行うため、深夜まで作業を行うことがあります。

※10月中旬より、北別館の工事を再開するため、敷地内北側での作業が多くなります。

【問い合わせ先】

〔建築工事〕 前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 87-8632

〔電気設備工事〕 佐電工・シグマ・電興社特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 50-5806

〔機械設備工事〕 栄城・有明・古賀設備共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 85-8804

鳥栖市役所 庁舎建設課 ☎ (0942) 85-8755
